

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
1	甘孜州农村住房维修加固	甘孜州	康定市 泸定县 丹巴县 九龙县 雅江县	维修加固	维修加固农村住房19662户，其中康定市3203户、泸定县12928户、丹巴县53户、九龙县1458户、雅江县1260户、海螺沟760户。	4326	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持甘孜州农村住房维修加固情况为：康定市3063户，泸定县12365户，丹巴县53户，九龙县1431户，雅江县1163户，海螺沟760户。拨付资金4143.7万元。
2	甘孜州农村住房恢复重建	甘孜州	康定市 泸定县 九龙县 雅江县 海螺沟	恢复重建	恢复重建农村住房5335户（含避险搬迁619户）、共78.36万平方米，其中康定市34户、泸定县3581户（含避险搬迁490户）、九龙县111户、雅江县10户、海螺沟1599户（含避险搬迁129户）。货币化安置受灾居民727户，其中泸定县695户、九龙县6户、海螺沟26户。	18656	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持甘孜州农村住房恢复重建情况为：康定市30户，泸定县2965户，九龙县116户，雅江县1户，海螺沟1002户。拨付资金12351.6万元。
3	甘孜州城镇住房维修加固	甘孜州	康定市 泸定县 海螺沟	维修加固	维修加固城镇住房1102户，其中康定市546户、泸定县179户、海螺沟377户。	242	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持甘孜州城镇住房维修加固情况为：康定市311户，泸定县179户，海螺沟377户。拨付资金190.3956万元。
4	甘孜州城镇住房恢复重建	甘孜州	康定市 泸定县 海螺沟	恢复重建	恢复重建城镇住房331户、共2.59万平方米，其中康定市8户、泸定县35户、海螺沟288户。货币化安置海螺沟受灾居民1户。	1062	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持甘孜州城镇住房恢复重建情况为：康定市7户，泸定县21户，海螺沟277户。拨付资金975.66万元。
5	泸定县级集中式饮用水源地水质监测站建设	甘孜州	泸定县	新建	建设水质监测站1座，配置相应设施设备。	450	已完工，已开展结项工作。	<p>该项目于2023年9月23日邀请专家组完成了本项目的验收工作，目前设备仪器运行正常。2024年8月经审计确定该项目总计支出资金299.755万元，截至到8月21日，已拨付资金299.755万元。</p>    


“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
6	泸定县环境监测站建设	甘孜州	泸定县	新建	建设环境监测站1座，面积2400平方米，其中环境监测站实验用房1600平方米，业务用房300平方米。	1000	完成总工程量58%。	<p>目前已经完成土方开挖及基坑支护工程、基础工程、主体结构混凝土浇筑以及配套附属措施工程，已完工程量约为总工程量的58%，已拨付资金400万元。</p> 

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
7	泸定县集中安置点生活垃圾设施建设项目	甘孜州	泸定县	新建	新建磨西镇磨岗岭村、柏秧坪村、共和村、磨子沟村、大杉树村5个集中安置点的垃圾设施，包括风景式垃圾桶（亭）62处、压缩式垃圾转运车（8立方米）2辆、压缩式垃圾转运车（12立方米）1辆。新建得妥镇、德威镇、兴隆镇、冷碛镇、泸桥镇、烹坝镇、岚安乡等15个集中安置点的垃圾设施，包括风景式垃圾桶（亭）560处、压缩式垃圾转运车（8立方米）15辆。	761	实施中，完成20%。	<p>该项目已完成完成产值117万元，完成20%（垃圾桶已购，部分未安放）。泸定县集中安置点生活垃圾处理设施项目于2024年8月2日完成项目采购，目前中标单位正在进行垃圾车辆采购，预计9月5日前完成垃圾车采购工作。</p> 

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
8	泸定县集中安置点内部道路建设项目	甘孜州	泸定县	新建	新建磨西镇磨西镇磨岗岭村、柏秧坪村、共和村、磨子沟村、大杉树村5个集中安置点的联户路及入户路6.2公里，太阳能路灯59盏及挡墙工程。新建得妥镇、德威镇、兴隆镇、冷碛镇、泸桥镇、烹坝镇、岚安乡等15个集中安置点的联户路及入户路16.35公里，太阳能路灯944盏及挡墙工程。	8633	实施中，完成95%。	<p>该项目得妥、德威镇统规自建集中安置点已完成建设累计完成产值约2123万元。泸定县统规自建集中安置点（岚安乡、烹坝镇、泸桥镇、冷碛镇、隆镇及德威镇）配套基础设施建设项目累计完成产值1413万元，完成本项目95%的，泸定县统规自建集中安置点（得妥镇）配套基础设施建设项目累计完成产值1237万元，完成本项目的95%</p> <p>   </p>

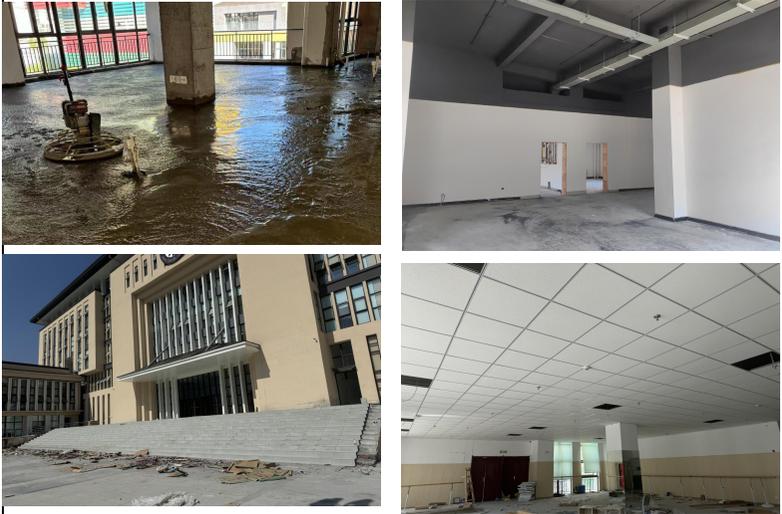
“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
9	泸定县集中安置点应急避险场所建设项目	甘孜州	泸定县	新建	新建磨西镇磨西镇磨岗岭村、柏秧坪村、共和村、磨子沟村、大杉树村5个集中安置点的应急避险场所（总面积约8800平米）。新建得妥镇、德威镇、兴隆镇、冷碛镇、泸桥镇、烹坝镇、岚安乡等15个集中安置点的的应急避险场所（共7个水泥硬化坝子，每个500平米、总面积约3500平米）。	1116	实施中，完成95%。	<p>该项目包含烹坝镇沙湾村社区聚集点村应急避难场所，泸桥镇咱里村泸桥镇小学应急避难场所，冷碛镇杵坨村社区聚集点应急避难场所，冷碛镇邓油坊村社区聚集点应急避难场所，得妥镇北头村自建安置点应急避难场所，德威镇统建集中安置点应急避难场所，目前已完成应急避难场所标识标牌制作，进行现场安装。现北头村应急避难广场正在施工，预计8月底完工。</p>   

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
10	甘孜州海螺沟中学	甘孜州	海螺沟	恢复重建	改扩建校舍4496平方米，维修加固校舍4681平方米，维修改造运动场1200平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	2287	实施中，完成90%。	<p>实施中，项目进度完成90%。</p> 
11	甘孜州海螺沟寄宿制小学	甘孜州	海螺沟	维修加固	维修加固校舍14422平方米，维修改造运动场1000平方米，恢复建设附属设施。	1156	已完工，待验收。	<p>已完工，待验收。</p> 

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
12	甘孜职业学院	甘孜州	海螺沟	维修加固	维修加固校舍55395平方米，恢复重建校舍400平方米及附属设施，配备设施设备。	5428	实施中，完成30%。	<p>甘孜职业学院2个应急项目已完工；政府采购项目共计8个，总投资3587万元，已完成所有招标工作，相关采购业务已启动。</p> 

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
13	海螺沟景区人民医院（甘孜州皮肤病防治院）	甘孜州	海螺沟	恢复重建	维修加固房屋4500平方米、围墙约3000米、堡坎约100米及附属设施等。新建门急诊楼、住院楼等约11000平方米，配套污水处理、配电、绿化等设施 and 医疗设备。	6800	实施中，完成80%。	<p>本项目为新建及改造工程，共6个子项（4个新建，2个改造）：新建门急诊医技住院综合楼C楼（含地下室）、新建门卫、新建医废暂存及污水处理用房、新建发热哨点、改造康复住院楼（原门诊A楼）、改造办公及生活楼（原中医专科门诊楼B楼），另维修围墙约800米、堡坎约100米等。</p> <p>截至2024年8月22日，2个改造子项室内改造已完成，维修围墙、堡坎基本完成；另4个新建子项进度情况如下：</p> <p>①新建门卫房：已完成了基坑开挖、基础施工、基坑回填、一层主体结构及大门钢结构的施工，余砌体及二次结构和安装、装饰工程，预计9月底全面完成。</p> <p>②新建医废暂存及污水处理用房：已完成了基坑开挖、基础施工、基坑回填、一层主体结构的施工，余砌体及二次结构和安装、装饰工程，预计9月底全面完成。</p> <p>③新建发热哨点房：已完成了基坑开挖、基础施工、基坑回填、一层主体结构的施工，砌体及二次结构完成30%，余安装、装饰工程，同样预计9月底全面完成。</p> <p>④新建门急诊医技住院综合楼C楼：已完成屋面工程、室内抹灰、室内大面腻子、</p> 

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
14	泸定县新闻出版和文化服务设施	甘孜州	泸定县	维修加固	维修加固磨西镇、燕子沟镇、得妥镇、德威镇、泸桥镇、冷碛镇文化院坝墙体，购置磨西镇、燕子沟镇、得妥镇、德威镇、冷碛镇新时代文明实践站（所）设施设备，购置磨西镇、县广播电视台设施设备。	1208	实施中，完成80%。 泸定县： 已完成98%，待验收。 海螺沟： 实施中，完成60%。	<p>新闻出版和文化服务设施（泸定县）项目已完成项目总计划的98%，得妥镇、德威镇、冷碛镇、泸桥镇文化院坝墙体维修加固已完成；新时代文明实践站（所）设施设备采购已完成并配送到各乡镇进行安装。截止目前已完成金光村、马列村、奎武安置点、长沙坝村、河坝村、紫河村、磨河村室内外文化墙安装。老街道、桐子林村、北头安置点的室内外文化墙正在安装中，预计8月底完成安装。；新闻出版和文化服务设施（海螺沟）项目目前已经基本完成了磨西镇、柏秧坪村室内外文化墙安装。大坪村、青冈坪村、新兴村、喇嘛沟村、南门关村、跃进坪村和燕子沟镇的室内外文化墙正在安装中，以上村文化墙安装进度已超过60%以上。咱地村、共和村已初步完成设计工作，正在进行最后的修订更正。</p>

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
15	海螺沟老年养护院（海螺沟中心敬老院重建项目）	甘孜州	海螺沟	恢复重建	恢复重建海螺沟老年养护院5000平方米，床位100张，配备设施设备。	1594	实施中，完成50%。	<p>主体建筑已完成50%，持续推进中。</p> 
16	甘孜州泸定老年养护院	甘孜州	泸定县	维修加固	维修加固墙体、挡土墙等9894平方米，配套完善步行道路、绿化、变电箱、基础设施、围墙、排水排污、文化墙等，改造2号楼、8号楼、9号楼。	978	完成总工程量的70%。	<p>甘孜州泸定老年养护院“9·5”地震灾后重建项目属四川省慈善联合总会支持项目。估算总投资为1128万元，主要内容及规模为维修加固墙体、挡土墙等9894平方米，配套完善步行道路、绿化、变电箱、基础设施、围墙、排水排污、文化墙等，改造2号楼、8号楼、9号楼。截止目前已完成项目总工程量的85%（其中室内装饰工程100%，室外总坪工程45%）。</p> 

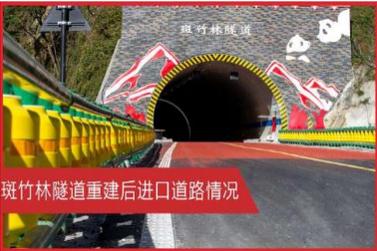
“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
17	泸定县冷碛镇社会福利和救助管理站	甘孜州	泸定县	维修加固	恢复重建洗衣房、公共厕所100平方米，维修加固受损墙体558平方米，提升50张床位护理能力，配备相关设施设备。	283	已完工，已开展结项工作。	<p>该项目已完工，并完成项目审计工作，总计拨付资金257.280621万元。</p>  
18	甘孜州社会福利院	甘孜州	康定市	维修加固	维修加固房屋3500平方米，改造提升现有建筑，维修加固围墙和堡坎。	159	已完工，待审计。	  

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
19	甘孜州救助管理站	甘孜州	康定市	维修加固	维修加固房屋1500平方米，修复屋面、墙面。	60	已完工，已开展结项工作。	<p>该项目已完工，并完成项目审计工作，总计拨付资金53.246871万元。</p>
20	S217泸定至石棉段	甘孜州	泸定县	恢复重建	恢复重建三级公路，其中泸定县甘谷地至得妥段32.1公里	7779	实施中，完成99%。	<p>路基、路面、桥涵、隧道病害治理、绿化工程已基本完工，正在进行项目收尾免疫完成项目99%。</p>

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
21	海螺沟景区公路	甘孜州	泸定县 海螺沟	恢复重建	恢复重建三级公路29.096公里。	25000	已完工。待审计。	<p>该项目已实施完毕，待审计，已拨付资金17500万元。</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">  <p>斑竹林隧道重建后进口道路情况</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>重建后蜿蜒曲折的K20~K23</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>青岗坪大桥桥头重建后情况</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>重建后蜿蜒曲折的K11~K13路段</p> </div> </div>

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
22	王岗坪景区公路	甘孜州	泸定县	恢复重建	恢复重建双车道公路，其中泸定县5公里。	1275	实施中，完成90%。	<p>王岗坪景区公路发旺村支线截止目前所有土石方工程、挡防类工程、路基路面工程及交安工程已经全部施工完成。其中路基工程：土石方开挖3.7万m³、路基填筑2.18万m³、低填浅挖0.17万m³、边沟3472.5m、挡土墙7944.3m³、急流槽149m³，完成683.63万元、路面工程：级配碎石功能层20540m²、水泥稳定碎石基础20540m²、透层粘层封层各20370m²、沥青混凝土面层20320m²，完成363.22万元、桥涵工程：涵洞98m，完成54.55万元、交叉工程完成25万元、交安工程：波形护栏1070m、路面标线1449.7m²，完成32.21万元，其他工程：27.97万元，累计完成产值1186.58万元。</p> 
23	雅安市农村住房维修加固	雅安市	石棉县 汉源县 荣经县 天全县	维修加固	维修加固农村住房11805户，其中石棉县11767户、汉源县26户、荣经县7户、天全县5户。	2597	石棉县、汉源县已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持雅安市农村住房维修加固情况为：石棉县11767户、汉源县26户，拨付资金2594.3601万元。
24	雅安市农村住房恢复重建	雅安市	石棉县 汉源县	恢复重建	恢复重建农村住房3849户（含避险搬迁386户）、共57.74万平方米，其中石棉县3644户（含避险搬迁315户）、汉源县205户（含避险搬迁71户）。货币化安置汉源县受灾居民62户。	12052	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持雅安市农村住房恢复重建情况为：石棉县3644户（含避险搬迁315户）、汉源县205户（含避险搬迁71户）。货币化安置汉源县受灾居民62户，拨付资金12052万元。
25	雅安市城镇住房维修加固	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固城镇住房3322户。	731	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持雅安市城镇住房维修加固情况为：石棉县3322户，拨付资金731万元。
26	雅安市城镇住房恢复重建	雅安市	石棉县	恢复重建	恢复重建城镇住房112户、共1.68万平方米。	358	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持雅安市城镇住房恢复重建情况为：石棉县112户，拨付资金358万元。

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
27	汉源县集中安置点内部道路建设项目	雅安市	汉源县	新建	新建汉源县宜东镇海亭村、富庄镇二郎河、大树镇麦坪村3个集中安置点的内部生产生活道路约3千米，路灯122盏。	700	已完工，待审计。	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
28	石棉县王岗坪小学	雅安市	石棉县	恢复重建	改扩建校舍9100平方米，建设运动场5000平方米及附属设施，配备设施设备。	4175	实施中，完成85%。	<p>石棉县王岗坪小学教学楼地基与基础完成100%，主体结构完成100%，二次构造完成100%，消防工程完成5%，装饰装修完成80%，屋面工程完成100%。学生宿舍地基与基础完成100%，主体结构完成100%，二次构造完成100%，装饰装修完成50%，水电安装完成65%，食堂及教师宿舍地基与基础完成100%，主体结构完成100%，二次构造完成100%。总工程量完成85%。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
29	石棉县幼儿园	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固校舍5860平方米，改造校舍8900平方米，扩建运动场2500平方米，恢复重建附属设施，配备设施设备。	3031	已完工，待审计。	<p>已完工，待审计。</p> 
30	石棉县向阳小学	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固校舍共5702平方米，维修运动场2230平方米，改造校舍4270平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	1358	已完工，待审计。	<p>已完工，待审计。</p> 

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
31	石棉县医疗卫生机构	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固石棉县医疗卫生机构业务用房62763平方米，附属设施及设备购置，其中石棉县人民医院业务用房27509平方米、石棉县疾控中心业务用房4221平方米、石棉县妇计中心业务用房4279.8平方米、安顺场镇县域医疗次中心业务用房2409平方米、新民乡卫生院业务用房5572.6平方米、丰乐乡卫生院业务用房2571平方米、迎政乡卫生院业务用房3201.8平方米、永和乡卫生院业务用房3803.9平方米、蟹螺乡卫生院业务用房3253.1平方米、新棉社区卫生服务中心业务用房5134平方米、新民乡小马村等10个村卫	3200	实施中，完成80%。	<p>土建已完成近80%的工程量，设备已全部完成采购。</p>  
32	石棉县乡镇（街道）综合文化站（中心）	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固10个乡镇（街道）综合文化站4103平方米，购置相关设施设备。	560	实施中，完成90%。	<p>设备设施采购部分已完成乐器类、服装设计与管理制作服务类采购；土建部分已完成总工程量的80%，正在进行部分内外墙和门窗安装工程。</p>     

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
33	石棉县村级全民健身场地恢复重建及设备购置项目	雅安市	石棉县	恢复重建	恢复重建51个村（社区）级全民健身场地，配套健身器材等。	1482	实施总，完成90%。	<p>已完成裁判员记分计时设备采购，工程部分完成总工程量60%。目前完成新民海尔村、安顺场镇安顺村、迎政乡八牌村、美罗镇碾子村、草科乡祥福街50号五个全民健身中心膜结构安装制作及场地平整。完成了丰乐乡三星村，永和乡白马村，安顺场镇魁沙村、新场村，草科乡和坪村、田湾河村、农家村，王岗坪二期广场等场地场平工作。</p> 
34	石棉县养老服务机构	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固石棉县福利院约11100平方米、第二敬老院约10000平方米、第三敬老院约7000平方米、新棉街道日间照料中心约600平方米，配备设施设备。	849	已完工，待验收。	<p>维修加固已完工，设备设施待验收。</p> 
35	石棉县农村公益性墓地	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固草科乡、王岗坪乡、新民乡公益性墓地墓区道路、墓台、墓穴、围栏、大门等，提升改造入院道路、文化宣传等，配套设施设备。提升改造丰乐、迎政、美罗、永和、蟹螺、安顺场等乡镇公益性墓地，增加园区绿化、文化宣传等设施。	492	已完工，待审计。	<p>已完工，待审计。</p> 

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
36	王岗坪景区公路	雅安市	石棉县		恢复重建双车道公路，其中石棉县54公里。	13725	已完工，待审计。	<p>已完工，待审计。</p> 
37	凉山州农村住房维修加固	凉山州	冕宁县 甘洛县	维修加固	维修加固农村住房487户，其中冕宁县468户、甘洛县19户。	108	已发放冕宁县全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持凉山州农村住房维修加固情况为：冕宁县381户，拨付资金84.492813万元。
38	凉山州农村住房恢复重建	凉山州	冕宁县	恢复重建	恢复重建农村住房3户、共0.05万平方米。	10	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持凉山州农村住房恢复重建情况为：冕宁县3户，拨付资金10万元。
